Órbita CRM: salvar o lançamento sem quebrar o produto

Plano para o board · Renato Garcia, Tech Lead · dia 10

A tese em uma frase

O evento é o que dá dinheiro hoje. Primeiro garanto o evento; vender o CRM ao público vem depois, em ondas.

R$ 6,3 mi

vendas da Semana do Closer que passam pelo WhatsApp dentro do CRM (70% de R$ 9 mi)

45 dias

até a data que o CEO anunciou em público

60 vendedores

e 15 mil inscritos operando ao vivo no CRM

1

Diagnóstico

O que está acontecendo de verdade e o que eu ainda não sei

Onde estamos: atrasado, acima do orçamento e frágil

R$ 665 mil

gastos numa versão 1 orçada em R$ 570 mil

40%

do escopo pendente: 25 de 62 funcionalidades

12%

de cobertura de testes, sem teste de carga

25 msg/s

pico do evento. Hoje é menos de 1 por segundo

A causa por trás de quase tudo

Ninguém na Órbita era dono técnico do produto. O fornecedor fazia, ninguém revisava, e as prioridades chegavam por WhatsApp de vários diretores. Agora esse dono sou eu.

Seis problemas, cinco causas

1	**Duplicidade e mensagem perdida (1, 2)**	Trabalho feito enquanto a Meta espera; fila no Redis sem confirmação; uma fila só para todos os clientes
2	**Custo de IA 4 vezes o previsto (3)**	Nenhum limite por cliente: um piloto gastou 22% do total
3	**Fornecedor imprevisível (4)**	Contrato por hora: a Órbita paga o retrabalho; código entra sem revisão
4	**Telas refeitas (5)**	O estúdio só vê a tela pronta na homologação, quando já custou caro
5	**Onze urgentes ao mesmo tempo (6)**	Não existe lista única nem dono da prioridade

O que ainda não sei e como descubro na semana 1

?

O que quebra com carga

Teste de carga no sistema atual, com o dobro do pico

?

Estado do módulo de automações

Leitura do código com a Ponte; só 2 devs que saíram conheciam

?

De quem são o código e as contas

Conferir repositório, AWS e conta da Meta no nome da Órbita

?

O que o contrato da Ponte permite

Prazo de aviso, multa e quem é dono do código

?

Como os vendedores atendiam antes

Esse jeito antigo é o plano B do evento

?

Custo real de IA por conversa

Medir por cliente e por dia antes de fixar o teto

2

Estratégia

O que entra nos 45 dias, como garantir o evento e o rumo até 180 dias

Os 45 dias: só o que o evento precisa

✓ Entra no lançamento

- Inbox e distribuição das conversas entre os 60 vendedores
- Histórico confiável: sem duplicar e sem perder (a PoC)
- Limite de envio por cliente
- Funil básico
- IA com teto de gasto e botão para desligar

× Sai, ou fica para depois

- A maior parte das 25 funcionalidades pendentes
- Automações congeladas para clientes de fora
- "Aberto a todos" de uma vez: vira lista de espera com entrada em ondas, por exemplo 50 clientes por dia

Linha do tempo com um ponto de decisão



Passou no teste

O evento roda no CRM, com as chaves para desligar IA e campanhas prontas se algo apertar.

Não passou: plano B

O evento roda do jeito antigo; o CRM segue com os 40 pilotos. A decisão é por um número, não por opinião.

De 90 a 180 dias: fornecedor, UX e time

1 Fornecedor

- Não trocar antes do evento: troca custa 1 a 2 meses pagando dois times
- Renegociar já: escopo fechado, revisão obrigatória, código e contas da Órbita
- Reduzir a Ponte de 6 para 3 devs a partir do mês 4

2 UX e código

- Uma biblioteca de componentes única
- O designer aprova a tela antes do código entrar
- Meta: retrabalho de tela caindo mês a mês

3 Time da Órbita

- Tech Lead (eu)
- 1 SRE e 1 QA de automação já no mês 1
- 2 devs seniores entre os meses 2 e 3

3

Execução e código

O que eu mesmo construí, como provo e como acompanho

Como a PoC resolve duplicidade e perda

Meta envia ou reenvia
o mesmo evento

→

Webhook

confere a assinatura, grava e responde 200 em poucos ms

→

Fila no Postgres

id de mensagem único: o reenvio é ignorado

→

Worker

grava o histórico; se falhar, tenta de novo em 1, 2, 4, 8 s

→

Fila de falhas

visível e reprocessável; nada some em silêncio

Na saída

- A resposta ou campanha é gravada antes de enviar: se cair no meio, ela continua lá
- Cada cliente tem um limite de envios por segundo, compartilhado entre todos os servidores
- Resposta automática também tem chave única: nunca sai duas vezes

Demo de 2 minutos: quatro provas

1. **50 requisições iguais ao mesmo tempo**

   1 registro e 1 resposta

2. **Derrubo 1 dos 3 servidores no meio**

   nada se perde

3. **Campanha de 1.000 do cliente A**

   não atrasa o cliente B

4. **Relatório de conferência**

   zero mensagens sem registro

Medido no notebook: 500 msg/s com p99 de 2 ms no webhook. O pico do evento é 25 msg/s.

Rituais e as métricas que o COO consegue cobrar

Métrica	Meta	Por quê
Mensagens duplicadas	0%	Hoje é 3%
Mensagens sem registro	0	Hoje é 1,8%, e ninguém sabe quais
Resposta do webhook (p99)	abaixo de 200 ms	A Meta reenvia quando demora
Custo de IA por cliente por dia	dentro do teto	Um piloto gastou 22% do total
Entrega por sprint	variação menor que 20%	Hoje oscila de 14 a 31 pontos

Rituais


- Daily de 15 min com a Ponte
- Revisão obrigatória antes de todo merge
- Relatório semanal ao COO com estes 5 números
- Reunião semanal de prioridade, com o COO como dono
- Decisão 10 dias antes do evento

4

Custos e retorno

Quanto custa, quando se paga e quanto custa errar

O plano cabe no R$ 1,2 mi, com reserva

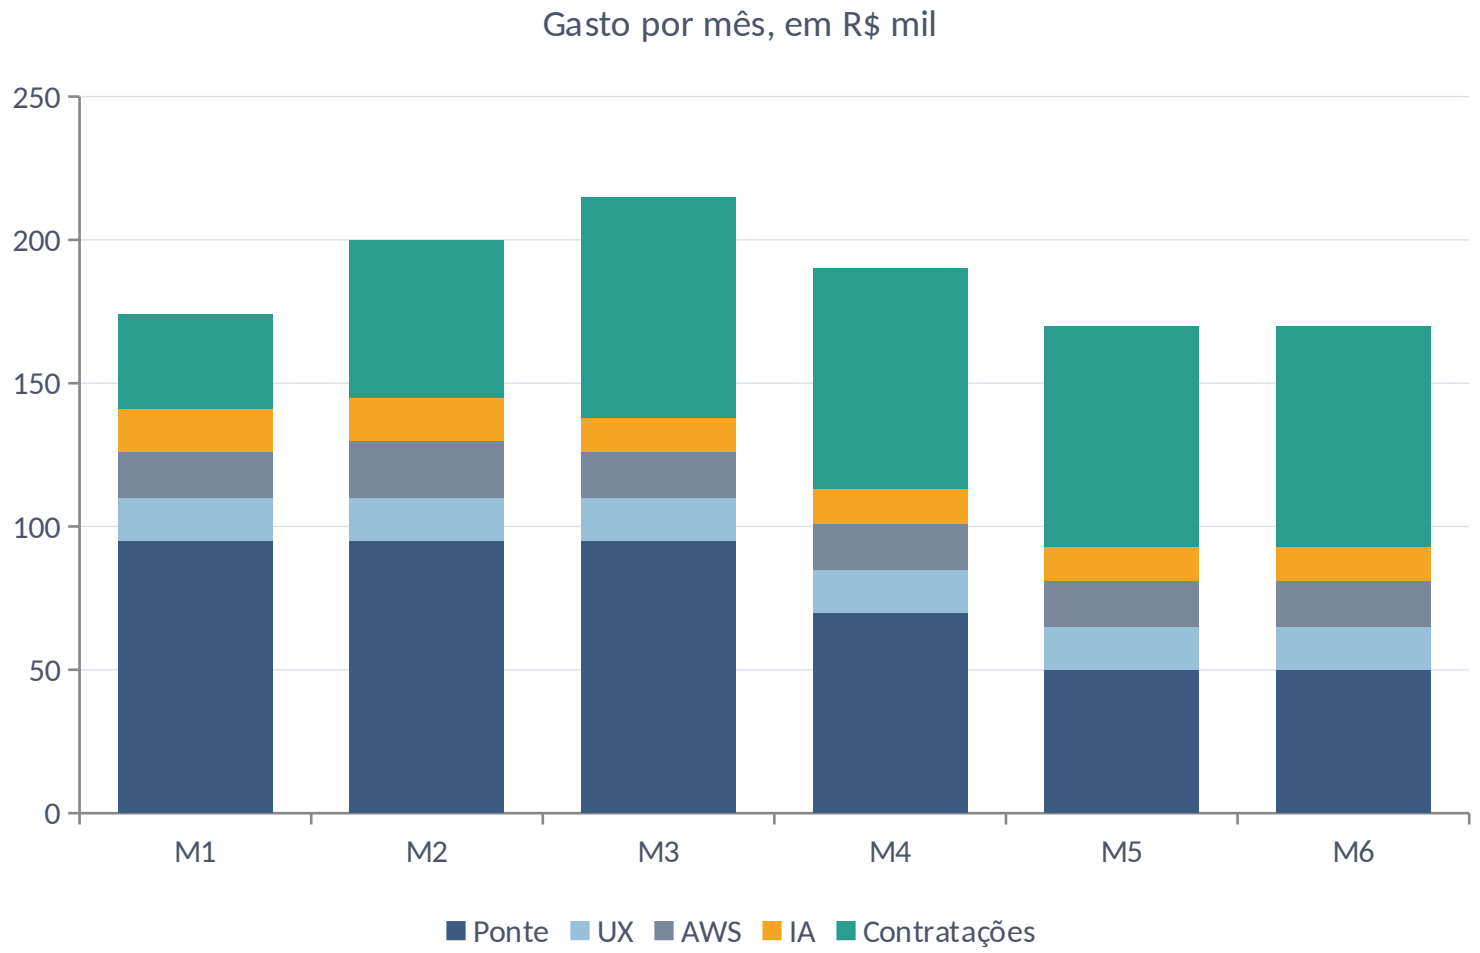

R$ 1.119 mil

total em 6 meses


R$ 81 mil

de reserva (7%)

R$ 38 mil/mês

era o que sobrava para contratar sem cortes

Três cenários para os próximos 12 meses

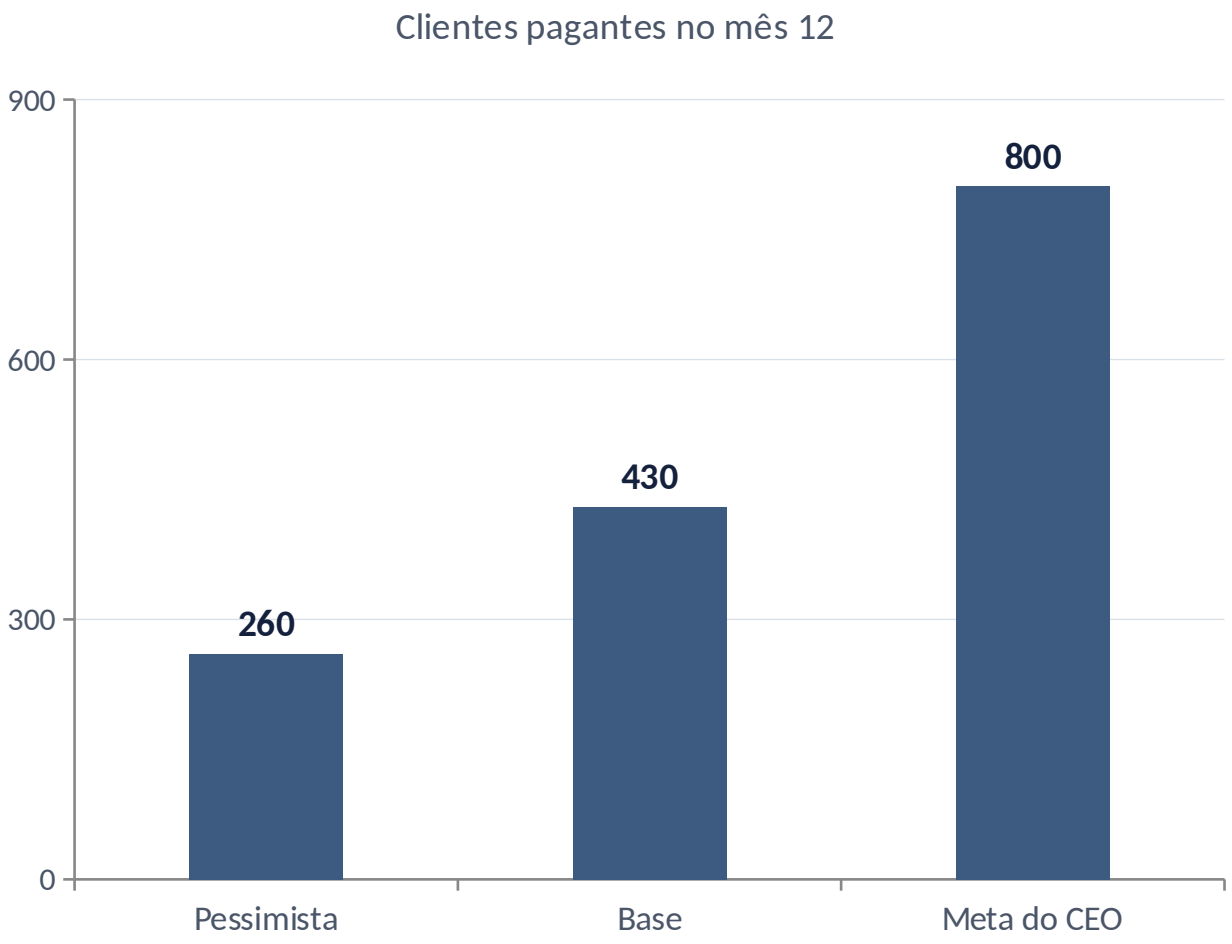

Cenário	No evento	Novos/ mês	Receita mês 12
Pessimista	75	25	R$ 129 mil
Base	150	40	R$ 214 mil
Meta do CEO	300	73	R$ 398 mil

Para chegar a 800 com 5% de cancelamento por mês, são 73 clientes novos todo mês.

Premissas: ticket de R$ 497; sobram uns R$ 385 por cliente depois de servidor, IA com teto e suporte; custo fixo de R$ 120 mil por mês depois dos 6 meses.

Quanto custa errar

R$ 630 mil

é o que se perde se o CRM cair no evento e levar só 10% das vendas. Metade do orçamento do semestre.

Proteger o evento é o retorno mais certo do plano.

IA sem teto dá prejuízo

R$ 6,2 mil

por mês de IA do piloto que mais usa

R$ 1.497

preço do plano Scale, o único com IA

Com teto por cliente, igual ao limite de envio da PoC, a IA para no teto e um vendedor assume. Vender o CRM ao público é uma aposta: no cenário base, se paga em mais de 2 anos.

5

Riscos e decisões

O que aciona o plano B e o que preciso do board hoje

Riscos e o que fazer se acontecerem

Risco	Como percebo	O que faço
O sistema não aguenta o pico	Teste de carga falha 10 dias antes	Plano B: evento no jeito antigo
A Ponte não aceita renegociar	Resposta em até 2 semanas	Começar a transição já, com reserva do orçamento
Não consigo contratar o SRE a tempo	Sem contratação até o dia 15	SRE por consultoria pontual só para o evento
A IA estoura o teto	Painel de custo diário	A IA para no teto e o vendedor assume
Conversão abaixo de 1%	Números da primeira semana de ondas	Reduzir a meta e o custo fixo antes do mês 4

O que peço ao board decidir hoje

1. Evento no CRM; "aberto a todos" vira lista de espera com entrada em ondas
2. Orçamento reorganizado: SRE e QA já, e teto de gasto de IA por cliente
3. Renegociar a Ponte agora, sem trocar antes do evento
4. Decisão por teste de carga 10 dias antes do evento, com plano B pronto
5. Uma lista de prioridades, um dono (o COO) e um canal só

Como usei IA e o que verifiquei

Onde usei

- Escrever o código da PoC e os testes
- Revisar o desenho e procurar falhas
- Organizar as contas do business case

O que conferi por conta própria

- Testes que quebram o código de propósito: sem id único, sem limite, sem trava. O teste pega cada um
- Derrubar servidor no meio do envio: nada se perde
- Cada número do orçamento e dos cenários, refeito à mão
